

# 建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称：中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司  
天然气管线项目（查汗陶勒盖嘎查）

建设单位：中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司

编制单位：内蒙古鸣霄技术咨询有限责任公司

二〇二二年十二月

编制单位：内蒙古鸣霄技术咨询有限责任公司

项目负责人：郑山虎

报告编制人：王茂森

电 话：13948675641

邮 编：017010

地 址：鄂尔多斯市康巴什区民富路3号金科凯城1号楼1层101

# 目 录

前言 .....	1
表一 项目总体情况 .....	1
表二 调查范围、因子、目标、重点 .....	3
表三 验收依据、执行标准 .....	5
表四 工程概况 .....	7
表五 建设项目建设项目环保设计符合性调查 .....	11
表六 环境影响评价回顾 .....	16
表七 环境影响调查 .....	18
表八 生态恢复调查 .....	21
表九 环境管理现状及监测计划 .....	23
表十 调查结论与建议 .....	26
附图 .....	28
附件 .....	29

## 前言

天然气是一种清洁、高效能源，它的开发利用有利于改善空气质量和进行环境保护，能够对我国的可持续发展战略起到重要作用。为满足滚动开发、有序生产的要求，达到统一规划、分步实施、有序生产的要求，中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司实施了“中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目（查汗陶勒盖嘎查）”。

2020年11月，内蒙古意丰环保科技有限公司编制完成《中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目（查汗陶勒盖嘎查）环境影响报告表》。2020年12月25日，鄂尔多斯生态环境局鄂托克旗分局以鄂环鄂评字[2020]177号对项目环境影响报告表进行了批复。

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令 第682号）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）等的有关规定，需查清工程在施工过程中对《环境影响报告表》和工程设计文件所提出的环境保护措施和建议的落实情况，调查分析工程在建设期间对环境已造成的实际影响及可能存在的潜在的影响，以便采取有效的环境保护补救和减缓措施、为工程竣工环境保护验收提供依据、全面做好环境保护工作。本次竣工环境保护验收内容为项目施工期和运营期。中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司委托内蒙古鸣雷技术咨询有限责任公司对项目开展竣工环境保护验收调查工作。

我公司接受委托后，与建设单位积极协作，共同开展了工程资料收集和现场踏勘等工作，对项目所在地调查范围内的环境敏感点分布情况、受工程建设影响的生态恢复状况、水土保持情况、工程环保措施的执行情况等方面进行了现场踏勘。调查人员收集并详细参阅了工程设计资料及工程竣工验收的有关资料，编制完成了《中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目（查汗陶勒盖嘎查）竣工环境保护验收调查报告表》。

在本项目验收调查过程中得到了环保部门、建设单位及其他有关单位的大力支持，在此一并表示感谢。

表一 项目总体情况

建设项目名称	中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目（查汗陶勒盖嘎查）					
建设单位	中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司					
法人代表	于开斌		联系人		李洋	
通信地址	内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇鸿沁路苏里格气田生产指挥中心					
联系电话	18842772225	传真	/		邮编	017300
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇查汗陶勒盖嘎查					
项目性质	新建		行业类别		石油和天然气开采辅助动B1120	
环境影响报告表名称	中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目（查汗陶勒盖嘎查）环境影响报告表					
环境影响评价单位	内蒙古意丰环保科技有限公司					
环境影响评价审批部门	鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局	文号	鄂环鄂评字[2020]177号	时间	2020年12月25日	
投资总概算（万元）	12	环境保护投资（万元）		1.2	环保投资比例	10%
实际总投资（万元）	12	环境保护投资（万元）		2	环保投资比例	16.67%
建设项目开工日期	2021年3月					
建设项目投运日期	2022年6月					

<p>项目建设过程 简述（项目立 项~调试）</p>	<p>中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目（查汗陶勒盖嘎查）位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇查汗陶勒盖嘎查。</p> <p>本工程新建采气管线 1 条，管线总长 243m。管线选用 D114×5mm 的直缝钢管，管线的作业宽度为 8.0m。</p> <p>2020年11月，内蒙古意丰环保科技有限公司完成《中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目（查汗陶勒盖嘎查）环境影响报告表》编制工作。</p> <p>2020年12月25日，鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局以鄂环鄂评字[2020]177号对该环评报告表进行了批复。</p> <p>项目于2021年3月开工建设，于2022年6月投入试运行。</p>
------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**表二 调查范围、因子、目标、重点**

<p>调查范围</p>	<p>本次验收范围为中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目（查汗陶勒盖嘎查）。调查时段为施工前期、施工期、运营期，本次调查范围原则上与环评范围保持一致。</p> <p>本次调查范围：</p> <p>（1）建设项目管线两侧50m范围内生态恢复情况；</p> <p>（2）建设项目在施工期管道开挖地表恢复情况和环保设施的运行情况，是否符合使用的要求；</p> <p>（3）建设项目投入的环保措施是否符合经批准的设计文件和环境影响报告中提出的要求。</p>																												
<p>调查因子</p>	<p>（1）施工临时占地及时覆土绿化。</p> <p>（2）管线开挖土方及时回填覆土绿化。</p> <p>（3）是否有临时施工营地，施工便道。</p>																												
<p>环境保护目标</p>	<p>本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇查汗陶勒盖嘎查，周边200米无居民、集镇、人口集中地，亦无学校、医院、油库、风景名胜等环境敏感点和特殊保护目标。环境保护目标及保护级别见表2-1。</p> <p style="text-align: center;"><b>表 2-1 环境保护目标及保护级别</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">环境要素</th> <th style="width: 15%;">保护对象</th> <th style="width: 10%;">相对方位</th> <th style="width: 15%;">相对管线距离(m)</th> <th style="width: 15%;">保护目标</th> <th style="width: 25%;">保护级别</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>声环境</td> <td>管线200m范围</td> <td></td> <td>昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A)</td> <td></td> <td>《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2类标准</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">生态环境</td> <td>植被</td> <td></td> <td>被破坏植被恢复率100%</td> <td></td> <td rowspan="2">施工场地周围为重点</td> </tr> <tr> <td>水土保持</td> <td></td> <td>减少施工造成水土流失,保护固定、半固定沙地和草地</td> <td></td> </tr> <tr> <td>环境风险</td> <td colspan="5">管线中心线两侧200m范围</td> </tr> </tbody> </table>	环境要素	保护对象	相对方位	相对管线距离(m)	保护目标	保护级别	声环境	管线200m范围		昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A)		《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2类标准	生态环境	植被		被破坏植被恢复率100%		施工场地周围为重点	水土保持		减少施工造成水土流失,保护固定、半固定沙地和草地		环境风险	管线中心线两侧200m范围				
环境要素	保护对象	相对方位	相对管线距离(m)	保护目标	保护级别																								
声环境	管线200m范围		昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A)		《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 2类标准																								
生态环境	植被		被破坏植被恢复率100%		施工场地周围为重点																								
	水土保持		减少施工造成水土流失,保护固定、半固定沙地和草地																										
环境风险	管线中心线两侧200m范围																												

调查 重点	<p>本次验收调查重点是项目在建设及运营过程中造成的空气环境影响、水环境影响、声环境影响、固体废物影响、生态环境影响等，分析环境影响报告表和环保批复中提出的各项环境保护措施落实情况及有效性，并根据调查结果提出环境保护补救措施及改进建议。调查重点及主要调查对象见下表2-2。</p> <p style="text-align: center;"><b>表2-2 项目验收重点一览表</b></p>	
	序号	影响环境 调查重点
	1	空气环境 施工期采取的降尘措施以及运营期无组织废气排放情况
	2	水环境 施工期试压废水、生活污水以及运营期气田采出水的处置措施
	3	声环境 施工期及运营期管线两侧200m声环境及降噪措施
	4	生态环境 临时占地情况、生态恢复情况、生态补偿措施落实情况等
5	固体废物 施工期产生的生活垃圾和焊渣以及处置情况，运行期产生的固废的处置措施	

表三 验收依据、执行标准

<p>法律法规及相关文件</p>	<p>(1) 《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日施行；；</p> <p>(2) 《中华人民共和国环境影响评价法》，2003年9月1日施行，2018年12月29日第二次修订；</p> <p>(3) 《中华人民共和国水污染防治法》，2008年6月1日施行，2017年6月27日第二次修正；</p> <p>(4) 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日施行，2018年10月26日第二次修正；</p> <p>(5) 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日施行；</p> <p>(6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》2020年9月1日施行；</p> <p>(7) 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》国家环境保护部2011年第10号，2011年6月1日实施；</p> <p>(8) 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评〔2017〕4号，2017年11月22日施行；</p> <p>(9) 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》国家环境保护总局，2008年02月01日实施；</p> <p>(10) 环保部《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52号），2015年6月4日；</p> <p>(11)《中华人民共和国国务院令 第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月）；</p> <p>(12) 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》，2010年10月01日施行；</p> <p>(13) 《鄂尔多斯市环境保护管理条例》鄂尔多斯市人民代表大会常务委员会，2016年12月28日；</p> <p>(14) 《鄂尔多斯市环境保护局关于天然气开发环境保护管理办法》鄂环发〔2014〕91号；</p> <p>(15) 《鄂尔多斯市环境保护局关于天然气开发环境保护管理办法试行中有关事宜的通知》，鄂环发〔2015〕33号。</p>
<p>其他依据</p>	<p>(1) 《中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目（查汗陶勒盖嘎查）环境影响报告表》；</p> <p>(2) 《鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局关于中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目（查汗陶勒盖嘎查）环境影响报告表的批复》（鄂环鄂评字[2020]177号）。</p>

--	--

**表四 工程概况**

项目名称	中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目（查汗陶勒盖嘎查）		
<b>1、主要工程内容及规模</b>			
<p>本项目工程建设内容主要为集输管线工程，主体工程（管线工程）、辅助工程、公用工程、环保工程等组成。</p> <p>建设项目新建输气管线1条，管线总长243m。管线选用D114×5mm的直缝钢管，管线的作业宽度为8.0m。</p>			
<b>2、建设地点</b>			
<p>该项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇查汗陶勒盖嘎查。</p>			
<b>3、工程占地及土石方平衡</b>			
<p>①工程占地：本项目为1条输气管线建设工程，管线建设长度243m，管线选用D114×5mm直缝钢管，管线的作业宽度为8.0m，管线施工总占地共计1944m<sup>2</sup>，均为临时占地，占地类型为沙地。项目建成后管线全部进行恢复。项目不设临时施工便道、施工场和表土临时堆场，施工现场之间车辆运输和表土临时堆存全部在管沟两侧的施工作业带内进行。本项目占地情况见表4-1。</p>			
<b>表4-1 工程占地情况一览表</b>			
工程名称	占地面积（m <sup>2</sup> ）		占地类型（m <sup>2</sup> ）
	合计	临时占地	沙地
集输管线临时施工作业带	1944	1944	1944
<p>②土石方平衡：本工程建设土方开挖主要为管线施工，管线挖方用于管沟回填，且高出自然地平面0.3m，填挖基本平衡，本项目土石方汇总情况见表4-2。</p>			
<b>表4-2 工程占地情况一览表</b>			
工程名称	挖方（m <sup>3</sup> ）	填方（m <sup>3</sup> ）	弃方（m <sup>3</sup> ）
集输管线	2983.5	2983.5	0
<p>根据调查，施工结束后，项目临时占地已恢复原有土地使用功能。建成后不再使用的临时占地已进行覆土和植被恢复。验收调查期间无居民投诉现场。</p>			
<b>4、工程环境保护投资明细</b>			
<p>本项目建设总投资为12万元，环保投资2万元，占总投资的16.67%。本项目环保投资主要用于废气治理、固体废物处置、噪声污染防治以及生态恢复等，环保投资一览表见表4-3。</p>			

表4-3 环保投资一览表

类别	污染源	环保措施	投资 万元
废气	施工扬尘	施工现场及时洒水	0.1
		及时清理施工场地	
		蓬布遮盖堆积土方	
		土方转运密闭运输	
噪声	设备	选用低噪声设备，基础减振	0.2
固废	施工废料	集中收集，外售综合利用。	0.1
	职工生活垃圾	集中收集后定期清运，运送至就近垃圾填埋场统一处理。	0.2
风险	①集输管线敷设前，加强对管材和焊接质量的检查，未使用不合格产品。②按规定进行设备维修、保养，及时更换易损及老化部件，防止天然气泄漏事故的发生。③加强自动控制系统的管理和控制，严格控制压力平衡，采取先进的自动报警系统，加强事故防范及应急处理措施等措施。④为减轻集气管线内外腐蚀，采用优良防腐层（如环氧粉末、聚乙烯包覆、三层PE），改进阴极保护措施，定期对集输管线上的安全保护设施，如截断阀、安全阀等进行检查，加强对集输管线沿线重点敏感地段的环保管理，定期进行环境监测。		0.4
植被恢复	管线完成后植被恢复，植被恢复以当地常见的沙蒿和沙柳为主，植被恢复1944m <sup>2</sup> 。		1
合计	--		2

### 5、生产工艺流程（附流程及产污位置图）

#### 管线施工工艺

本项目管线建设施工内容主要是管线布设、管沟开挖、管道加工、管道组装与焊接、管段下沟及回填、清管、试压、置换等。

施工流程及产排污节点见图 4-1。

#### ①管线布设

管线施工前先根据选线情况进行路线布设。

#### ②管沟开挖

本项目采气管线采用埋地敷设，管顶埋深约 1.2m，管沟边坡坡度以确保基坑边坡稳定为宜，施工作业带宽度控制在 8m 以内。

#### ③管道加工

新建采气管线主体采用三层 PE 防腐层，采气管线和助剂管线热煨弯头采用无溶剂液体环氧涂料（干膜厚度≥500μm）+聚乙烯热收缩带的防腐结构。

#### ④管道组装与焊接

管道组焊均采用沟上焊接，氩弧焊打底。焊接工艺评定试件应符合工程施工时现场

的自然条件；在其评定合格后，施工单位应编制相应焊接工艺规程；然后按焊接工艺规程进行现场组焊。焊接工艺评定应按《钢质管道焊接及验收》（SY/T4103-2014）的有关规定执行。

⑤管段下沟及回填

本工程管线施工范围内地形较为简单，管段均采用直埋敷设方式，回填时采取分层回填。

⑥试压

管道铺设完毕后，进行清管、试压作业，介质为空气。

⑦置换

本工程输气管道投运前采用氮气对管道内空气置换。先用氮气置换管道内的空气，再用天然气置换管道内的氮气。

施工流程及产排污节点见图4-1。

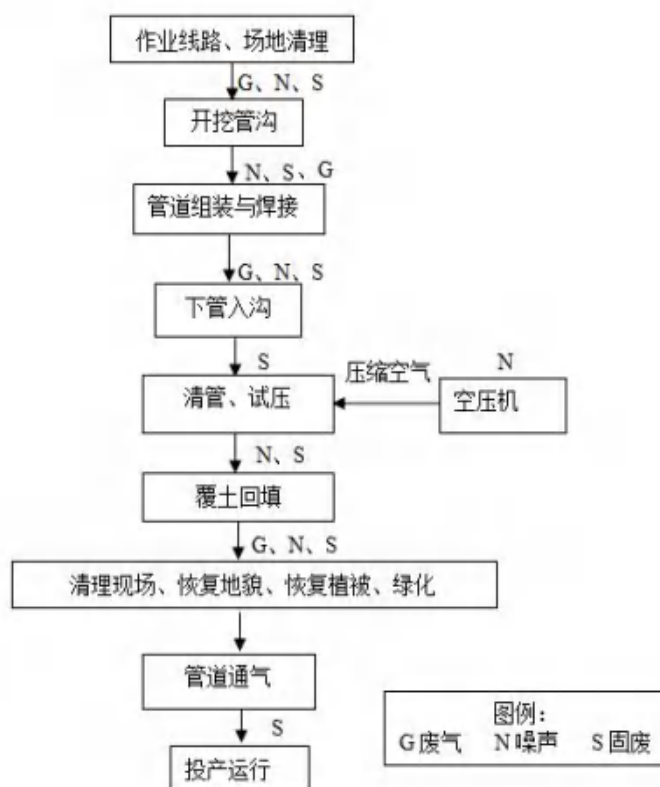


图 4-1 管线施工流程及产排污节点示意图

管线施工污染工序：

(1) 废气

管沟开挖堆土、平整及运输车辆、施工机械行驶引起的扬尘，柴油机械及运输车辆

排放的尾气，管道施工焊接时产生的焊接烟尘等。

（2）废水

不设施工营地，无生活污水。

（3）噪声

施工期噪声来源于施工开挖等施工中的机械设备运行、汽车运输等。

（4）固废

本项目的固体废弃物包括生活垃圾、施工废料。

（5）生态影响

输气管线施工过程中的生态影响主要体现在施工占地以及植被破坏、影响动物活动、引起水土流失等。管线施工过程中不可避免地将占用部分土地，对生态环境的影响主要是破坏地表植被和土壤结构，使施工区域植被盖度和植物多样性下降，自然景观破碎化，局部生态系统的结构和功能下降。施工期占地将对植被产生直接的破坏作用，导致了被占用部分植物种群和物种多样性发生变化，从而使群落的生物多样性降低，局部植物物种可能会消失或数量减少。施工期间，对两栖动物和爬行动物的活动有一定的影响，临时征地区域的鸟类等将被迫离开原来的领域，邻近领域的鸟类，由于受到施工噪声的惊吓，也将远离原来的栖息地。同时，由于管线施工原有地表部分被毁，造成土壤裸露，特别是挖填方过程中的堆土，会造成施工地段的水土流失。

**表五 建设项目建设项目环保设计符合性调查**

**1、建设项目地理位置符合性说明**

本项目地理位置环评要求与实际建设情况一致，位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇查汗陶勒盖嘎查，具体见项目地理位置图。环评要求及实际情况地理位置符合性见表5-1。

**表5-1 环评要求及实际情况地理位置符合性**

序号	管线名称	环评起点坐标		环评终点坐标		实际起点坐标		实际终点坐标		管径 (mm)	环评长度 (m)	实际长度 (m)	位置	一致性 说明
		纬度	经度	纬度	经度	纬度	经度	纬度	经度					
1	苏10-28-25至4号阀组管线	4327710	19282927	4327840	19282722	4327710	19282927	4327840	19282722	D114×5	243	243	查汗陶勒盖嘎查	一致

**2、工程组成与实际建设情况符合性调查**

项目管线工程组成与实际情况见表5-2。

**表5-2 管线工程组成及实际建设情况符合性说明一览表**

工程类别	项目名称	环评具体内容	实际具体内容	符合性说明
主体工程	管线工程	本工程新建输气管线1条，共243m，1条管线均选用D114X5mm 直缝钢管，1条管线的作业宽度均为8.0m，占地面积为1.0608hm <sup>2</sup> 。	本工程新建输气管线1条，共243m，1条管线选用D114X5mm直缝钢管，1条管线的作业宽度均为8.0m，占地面积为1944m <sup>2</sup> 。	一致
辅助工程	管线标识	本项目在管线沿线设置里程桩、转角桩、标志桩和警示牌等永久性标识。1条管线共设置2个里程桩、0个转角桩、12个标志桩和0个警示牌。	本项目1条管线共设置2个里程桩、12个标志桩。	一致
防腐工程	天然气管线	本项目采用三层PE防腐涂层输气管道成品，现场施工研仅对管道焊接接口处进行防腐处理。	本项目采用三层PE防腐涂层输气管道成品，现场施工研仅对管道焊接接口处进行防腐处理。	一致
公用工程	供排水	本项目在施工过程中不设置施工营地，无供排水工程。	本项目在施工过程中不设置施工营地，无供排水工程。	一致

环保工程	废气	施工扬尘	管线敷设采用分段施工，管线开挖出的底层土及表土采取苫盖措施。	管线敷设采用分段施工，管线开挖出的底层土及表土采取苫盖措施。	一致
		焊接、打磨废气	采用氧弧焊焊接方式，污染物产生量小，自然扩散	采用氧弧焊焊接方式，污染物产生量小，自然扩散	一致
		柴油发电机等机械设备及运输车辆废气	场地空旷，便于扩散。	场地空旷，便于扩散。	一致
	废水	管线施工过程中采用空气试压，无生产废水；管线工程不单独设施工营地，盥洗废水暂存生活污水储罐，收集后就近送污水处理厂处理。	管线施工过程中采用空气试压，无生产废水；管线工程不单独设施工营地，无生活污水产生。	一致	
	噪声	采用先进低噪设备，分段施工，严禁午间及夜间进行产生噪声污染的施工作业。	采用先进低噪设备，分段施工，未在午间及夜间进行产生噪声污染的施工作业。	一致	
	固废	施工废料	施工废料部分可回收利用，剩余部分集中收集定期运往当地一般固废填埋场处置。	施工废料收集后综合利用。	一致
		生活垃圾	本项目在施工过程中不设置施工营地，施工中生活垃圾主要包括施工人员产生的废弃包装、果皮等，采用垃圾袋集中收集，由公司专车定期送当地生活垃圾填埋场处置。	本项目在施工过程中不设置施工营地，施工中生活垃圾主要包括施工人员产生的废弃包装、果皮等，采用垃圾袋集中收集后拉至项目部处理。	一致
	管线施工弃土	管道施工中分层开挖、分层堆放及分层填埋，将表层土、底层土分开堆放（表土堆存在管沟左侧，底层土堆存在管沟右侧），开挖土堆存区控制在两侧扰动范围内（4.0m），不新增占地；施工结束后分层回填，恢复原土层，保护土壤肥力，以利后期植被恢复。回填后剩余的弃土拉运至当地指定地点处置，不单独设置弃土场。	无弃土产生。	一致	

	绿化	输气管线临时占地恢复后种植当地浅根系植被。施工完工后植被要在第一个雨季完成。临时占地中的天然草地植被恢复率100%，恢复绿化面积不少于0.42432hm <sup>2</sup> ，恢复后植被覆盖率达到75%以上。	管线完成后对临时占地进行植被恢复，沙地植被恢复以扦插柠条和沙柳网格为主，恢复面积1944m <sup>2</sup> 。	一致
风险工程	风险管理	建设单位制定了 HSE作业指导书，岗位建有标准操作卡，针对不同事故类型编制事故风险应急预案。	建设单位制定了 HSE作业指导书，岗位建有标准操作卡，针对不同事故类型编制事故风险应急预案。	一致

### 3、环评批复落实情况符合性调查

建设项目环评批复落实情况具体说明见表5-3。

表5-3 建设项目环评批复落实情况一览表

序号	建设项目环评批复要求	实际落实情况	符合性说明
1	加强施工期环境管理，土石方开挖及管道安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。管线施工过程须做到“分层开挖、分层堆放和分层回填”，施工结束后及时进行植被恢复并与周围生态景观协调一致。建设单位应制定详细的生态植被恢复措施与计划，并安排足够的生态恢复专用资金，保证施工结束后能立即进行生态恢复。	土石方开挖及管道安装过程中严格按照设计要求施工，缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。管线施工过程做到“分层开挖、分层堆放和分层回填”，施工结束后及时进行植被恢复并与周围生态景观协调一致。建设单位制定了详细的生态植被恢复措施与计划，并安排足够的生态恢复专用资金，保证施工结束后能立即进行生态恢复。	已按照批复进行落实
2	各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车、篷布等防尘设备，定期洒水，有效控制施工期的扬尘污染。物料堆场等的选址应远离居民区等环境敏感目标。居民点附近施工须设置围挡，降低扬尘对居民的影响。选用低噪声施工机械，采取有效措施控制施工期噪声污染。在环境敏感点附近，禁止夜间施工，防止噪声扰民。确有需要实行夜间作业的，须提前经有关部门批准，并对外公示。施工期间的管沟挖方用于埋管后的覆土回填，少量弃土用于附近低洼处填补；生活垃圾采用垃圾袋集中收集运送至就近的垃圾填埋场统一处理；产生的施工废料收集后外售综合利用。	各种施工活动严格控制在施工区域内，配备洒水车、篷布等防尘设备，定期洒水，有效控制施工期的扬尘污染。物料堆场等的选址远离居民区等环境敏感目标。选用低噪声施工机械，采取有效措施控制施工期噪声污染。未在夜间进行施工。施工期间的管沟挖方用于埋管后的覆土回填，少量弃土用于附近低洼处填补；生活垃圾采用垃圾袋集中收集运送至项目部统一处理；产生的施工废料收集后外售综合利用。	已按照批复进行落实

3	管线穿越道路须增加管线壁厚度，做好防腐、防渗措施，制定合理的穿越方案，并在征得有关主管部门的同意后方可实施。	本项目管线未进行穿越。	已按照批复进行落实
4	管线设计须符合《输气管道工程设计规范》和《原油和天然气工程设计防火规范》要求，确保不会对周围敏感目标产生不利影响。按照相关法律、法规和技术规范要求，禁止在井场、管线附近建设居民点、医院等敏感建筑物。	管线设计符合《输气管道工程设计规范》和《原油和天然气工程设计防火规范》要求，不会对周围敏感目标产生不利影响。按照相关法律、法规和技术规范要求，未在管线附近建设居民点、医院等敏感建筑物。	已按照批复进行落实

#### 4、实际工程量与工程变化情况，说明工程变化原因

根据本项目工程竣工资料、环评报告和对工程现场情况的调查，本项目建设主要工程量变化如下：

表 5-4 项目实际工程量与变化情况一览表

项目	环评阶段建设内容	实际建设工程内容	变化情况	变动分析
建设地点	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗 乌兰镇查汗陶勒盖嘎查	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌 兰镇查汗陶勒盖嘎查	一致	/
建设性质	新建	新建	一致	/
建设规模	建设采气管线243m	建设采气管线243m	一致	/
占地面积	临时占地1944m <sup>2</sup>	临时占地1944m <sup>2</sup>	一致	/
	工程总占地1944m <sup>2</sup>	工程总占地1944m <sup>2</sup>		
环保措施	固废 生活垃圾统一收集后送当地环卫部门指定地点处置，废焊条回收利用，废防腐材料属于危险废物，统一收集后交由有资质单位回收处置，开挖土石方分层堆放，管道下沟后分层回填	生活垃圾统一收集后拉运至项目部统一处置，废焊条、废防腐材料统一收集后外售综合利用，开挖土石方分层堆放，管道下沟后分层回填	一致	/

#### 5、项目重大变动情形判别分析

本项目含采气管道建设内容，根据《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）中油气管

道建设项目重大变动清单规定，对本项目管线工程建设重大变动情形判别见表 5-5。

表5-5 项目管线工程重大变动情形判别分析

序号	环办[2015]52号		本项目实际工程	是否造成重大变动
1	规模	线路或伴行道路增加长度达到原线路总长度的30%及以上	本项目实际建设采气管线243m	否
		输气管道设计输量或设计管径增大	本项目管线设计输气量未变化，管径（D114×5mm）与环评一致	否
2	地点	管道穿越新的环境敏感区；环境敏感区内新增除里程桩、转角桩、阴极保护测试桩和警示牌外的永久占地；在现有环境敏感区内路由发生变动；管道敷设方式或穿跨越环境敏感目标施工方案发生变化	本项目不涉及环境敏感区；管线占地均为临时占地；管线为地埋敷设，敷设方式未发生变化	否
		具有油品储存功能的站场或压气站的建设地点或数量发生变化	本项目不涉及具有油品储存功能的站场或压气站建设内容	否
3	生产工艺	输送物料的种类由输送其他种类介质变为输送原油或成品油；输送物料的物理化学性质发生变化	本项目输送物料为天然气，种类及化学性质未发生变化	否
4	环境保护措施	主要环境保护措施或环境风险防范措施弱化或降低	本项目采取的环境保护措施和风险防范措施与环评一致，经调查，本项目施工期及运营期未发生环境污染事故和环境风险事故	否

由上表所示，项目规模、地点、性质、主体生产工艺未发生变化，污染防治措施未降低及弱化，故项目变动不属于《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》中的重大变动内容，纳入本次竣工环境保护验收管理一并解决。

## 表六 环境影响评价回顾

### 环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、固废固体废物等）

根据《中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目（查汗陶勒盖嘎查）环境影响评价报告表》关于项目生态、声、大气、水、固体废物等环境影响的分析，本次环境影响评价回顾如下：

#### 1、生态环境影响回顾

项目施工期临时占地范围较大，对生态的影响不可忽视，如处理不当将造成大面积的植被破坏，破坏后不能得以恢复将会对当地生态环境造成不良影响。在采取相关措施后，很大程度上能够降低对当地植被的破坏和野生动物生存环境的影响，珍惜物种得以保存，植被能在施工结束后得以恢复。

#### 2、声环境影响回顾

项目施工期噪声主要来自设备运转时发出的机械噪声，由于项目施工期短，且随着施工结束噪声影响也将消失，因此项目噪声对环境影响可接受。

#### 3、大气环境影响回顾

施工期废气主要包括管线施工扬尘、焊接打磨废气和机械设备、运输车辆废气，由于施工工期较短，且施工区域位于室外开阔地带，因此对周围环境空气影响可接受。

#### 4、水环境影响回顾

本项目野外施工时携带足量饮用水即可，不在野外盥洗及食宿，不产生职工生活盥洗污水。综上所述，项目施工期对周围水环境影响较小。

#### 5、固体废物环境影响回顾

施工过程中产生的固体废物主要是多余土、管线施工废料和生活垃圾。

多余土用于管线作业带的土地平整，并进行绿化；管线施工废料集中收集后定期后外售综合利用；生活垃圾集中收集后定期运送至就近的垃圾填埋场统一处理，不会对外环境产生影响。

#### 6、环境影响评价总体结论

本项目环境影响评价认为，工程在施工期和营运中严格按相应的治理措施和建议进行治理和管理，使项目对周围环境的影响控制在可接受范围内，从环境保护的角度衡量，本项目是可行的。

**各级环境保护行政主管部门的审批意见：**

2020年12月25日，鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局对《中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目（查汗陶勒盖嘎查）环境影响报告表》以“鄂环鄂评字[2020]177号文”予以批复，具体环保要求见附件。

表七 环境影响调查

施工期	
生态影响	<p><b>1、现场勘查结果</b></p> <p>经现场调查得知，工程完工后建设单位对临时占地进行了清理和恢复，恢复了土地原有功能。工程临时占地植被恢复治理率达100%。部分地段植被恢复效果一般，植被生长较稀疏，沙蒿、沙柳属于耐干旱植物，生命力极顽强，预计在1到2年内，项目临时占地植被将完全恢复。</p> <p><b>2、存在问题及补充建议</b></p> <p>存在问题：部分临时占地恢复情况一般，植物生长稀疏。</p> <p>补充建议：建议加强项目临时占地植被抚育工作；建议运营期加强巡检工作，关注井区水土流失情况，出现问题及时修复，避免影响植被生长。</p>
污染影响	<p>经调查核实，工程施工期产生的各种污染物均得到了有效的处置，未对当地水环境、大气环境、声环境造成影响。调查期间，各环境要素均恢复到施工前水平，施工期间，未发生环境污染事件，也无扰民纠纷 and 环境保护投诉事件发生。</p> <p><b>1、大气环境影响调查</b></p> <p>本项目施工期大气环境影响主要包括管沟开挖堆土、运输车辆、施工机械行驶引起的扬尘，柴油机械及运输车辆排放的尾气，管道施工焊接时产生的焊接烟尘，项目各单项工程施工期较短，排放量较少，未对区域环境空气质量造成明显影响，随着施工结束，大气环境已经恢复到施工前水平。</p> <p>通过调查，项目施工期废气对当地环境影响较小，未造成大气污染，也无扰民纠纷和投诉现象发生。</p> <p><b>2、水环境影响调查</b></p> <p>项目在建设过程中产生的废水主要为生产废水和生活污水。本工程施工过程中管道试压采用空气试压，无生产废水；项目不设施工营地，无生活污水。</p> <p>验收调查期间，在项目区域内，工程建设未对当地地下水环境造成污染影响。同时对农户进行了询问，未对其饮用水造成污染影响。</p> <p><b>3、声环境影响</b></p> <p>本项目施工期噪声来源于施工开挖等施工活动中的施工机械运行、汽车运输等。经现场调查，本项目各管线200m范围内无居民住宅。施工期间未发生噪声污染</p>

	<p>事件，也无无扰民纠纷和投诉现象发生。</p> <p><b>4、固体废物影响</b></p> <p>施工过程中产生的固体废物主要包括生活垃圾、施工废料和弃土。</p> <p>根据调查，本项目产生的生活垃圾收集后拉运至项目部统一处理；施工废料外售综合利用；管线施工产生的弃土用于附近低洼处填补，不外排。</p> <p>项目所产生的固体废物均得以妥善处理 and 处置，现场调查未发现施工期固废遗留。项目建设产生的固体废物对周围环境没有造成二次污染影响，且无扰民纠纷和投诉现象发生。</p>
社 会 影 响	<p>根据现场调查及询问，项目施工期间，对农户的生活质量等没有造成影响。</p>
环 境 风 险	<p>根据调查，项目施工期未发生环境风险事故，未对周围环境造成影响，环境风险防范措施有效。</p>

运营期	
污 染 影 响	<p><b>1、大气环境影响</b></p> <p>输气管线在正常运营过程中为封闭状态，无废气产生，建设单位设专业人员定期负责输气管线的巡检工作，在巡检过程中会有少量的汽车尾气排放，由于项目每天只有1辆汽车进行巡检，产生的汽车尾气量很少，对环境影响较小。</p> <p><b>2、水环境影响</b></p> <p>本项目运营期无生产废水产生。</p> <p><b>3、声环境影响</b></p> <p>气井在正常运营过程中无噪声，建设单位设2人专业负责各个气井运营过程中的巡检工作，在巡检过程中会产生交通噪声，每日巡检1次，每次用1辆汽车，因此，汽车产生的噪声对环境影响较小。</p> <p><b>4、固体废物影响</b></p> <p>本项目为单井管线，运营期不进行清管，故无清管废渣。</p> <p>运营期产生的固废主要为巡检工作人员产生的生活垃圾。巡检人员均为中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司的员工，产生的生活垃圾经随身携带的垃圾袋集中收集后，回收至区部统一处置。</p>
生 态 影 响	<p>建设单位对施工期临时占地采取了植被恢复措施，通过种植沙蒿、沙柳等植物以及播撒草籽以降低土地沙地化，减少水土流失。</p> <p>运营期间主要是生态自然恢复过程，不会产生新的生态影响，随着时间推移，自然生态环境逐步好转。</p>

表八 生态恢复调查

施工过程中严格控制施工范围，表土分层开挖、原顺回填，提高植被成活率。该项目根据管线周边环境采取不同防护措施对管线作施工作业带进行植被恢复。

具体植被恢复情况如下：

临时占地面积 (m <sup>2</sup> )	恢复面积 (m <sup>2</sup> )	占地 类型	恢复措施
1944	1944	沙地	临时占地采用插播沙蒿网格（0.8m×0.3m）进行植被恢复作业，并播撒沙蒿、柠条等适宜当地植被恢复的草籽。

植被恢复情况：





表九 环境管理现状及监测计划

### 一、环境管理机构设置

中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司根据HSE管理体系标准和中国石油天然气集团公司（CNPC）建立HSE管理体系的规定和要求，参照公司的安全环境管理机构设置情况，建立了HSE管理机构组织。在基层各站、队设HSE管理小组，组长由主任（队长、站长）担任，组织由副主任和技术人员担任，指派一名懂健康—安全—环境技术且经过专门HSE管理培训并有一定管理能力的技术人员担任或兼职HSE现场监督员。

本项目施工过程中设立1名安全—环境技术现场监督员，经过专门HSE管理培训并有一定管理能力，专门负责安全环境问题，每周进行站内巡查并记录检查结果。

#### 1、施工期

建设单位、施工单位设置了环境管理机构，建立了完善的环境管理体系，并有效实施，环境管理体系图见图9-1。

施工过程中，建设单位、施工单位和环境监理单位环境管理体系得到有效运行，建立了突发环境事件和环保投诉处置程序，整个施工过程中环境保护工作进行顺利。在施工期环境污染控制及生态保护与修复措施基本得到落实、项目配套建设的环保设施已按要求进行建设，项目施工期没有发生环境污染事故和环保投诉事件。

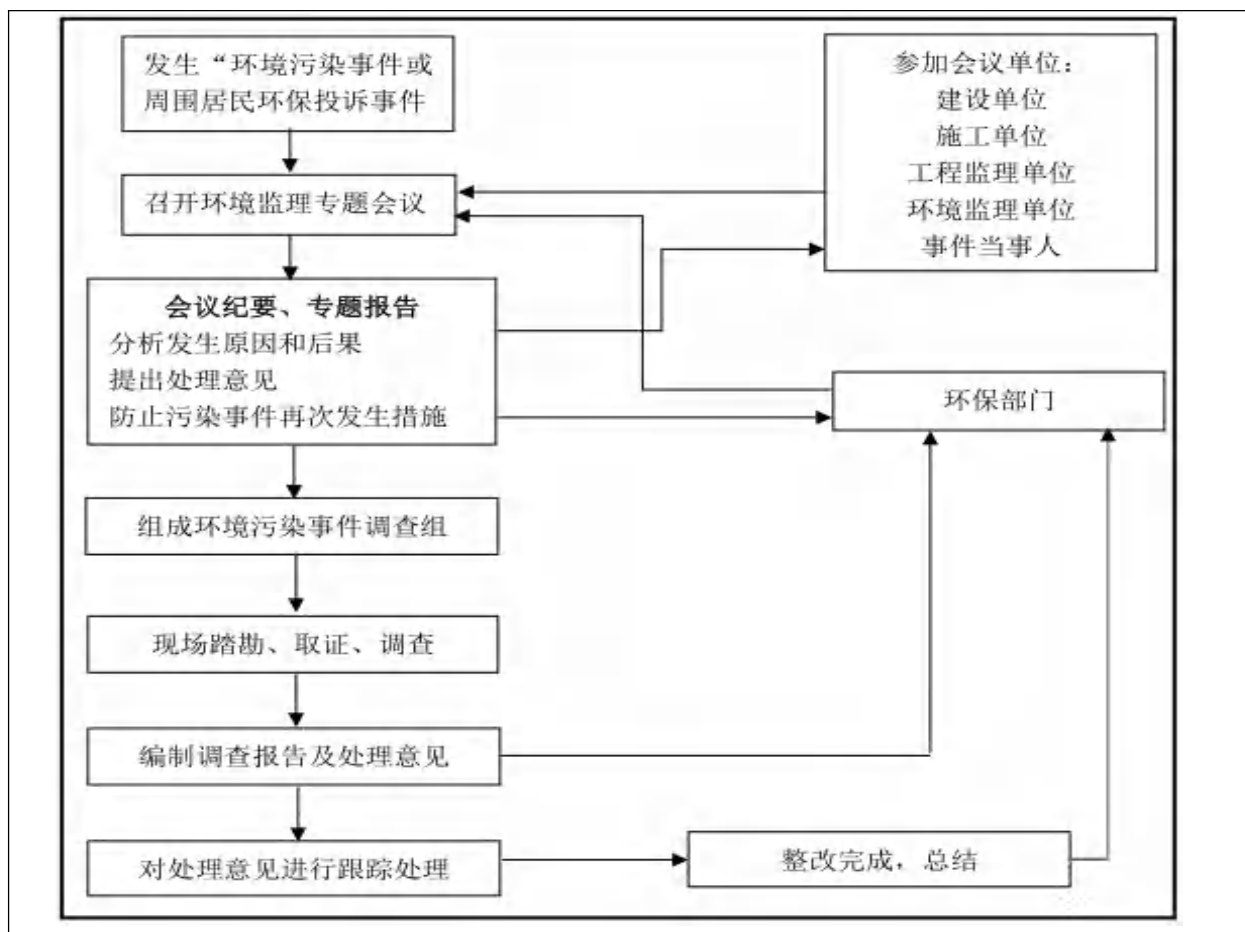


图9-1 施工期的环境管理体系结构图

## 2、运营期

运行期中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司设置了作业区天然气集输管道管理领导小组，组长为作业区经理，副组长为作业区党支部书记、作业区副经理，成员为生产运行室、综合管理室、巡线班，其中巡线班负责全区所有天然气管线日常巡护，生产运行室负责全区所有天然气管线维护管理（植被恢复、掩埋、防洪防汛处理），发现问题，及时上报并采取相应的应急措施或生态恢复补救措施。

## 二、环境监管能力建设情况：

1、建设单位负责日常的巡查工作，对沿线植被恢复、水土保持情况特别是灰土截水墙和石砌护坡进行检查，发现问题及时采取补救措施进行恢复。

2、依建设单位管理制度，定期测试管壁厚度、进行减薄测试，壁厚低于规定要求管段应及时更换，消除安全环境隐患。

3、建设单位设有应急救援指挥中心，编制并在鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局备案了《突发环境事件应急预案》。

### 三、环境影响报告表中提出的监测计划及落实情况：

管线巡检制度已落实，并定期对职工进行环境保护宣传。按照生态恢复方案继续落实生态恢复措施。

### 四、环境管理状况分析与建议：

- 1、加强对施工作业区域生态恢复和水土保持情况检查，发现问题及时采取补救措施。
- 2、加强对突发环境事件应急预案的培训和演练，提高应急响应能力。
- 3、加强对输气管线沿线村民的天然气安全知识宣传，设立有奖举报电话，发现安全隐患、水土流失点位，及时反映到应急救援中心。

表十 调查结论与建议

## 调查结论及建议

### 1、工程概况

中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目（查汗陶勒盖嘎查）位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇查汗陶勒盖嘎查，项目新建采气管线 1 条，管线总长 243m。管线选用 D114×5mm 的直缝钢管，管线的作业宽度为 8.0m。

工程总投资为 12 万元，其中环保投资 2 万元，环保投资占总投资的 16.67%。

### 2、环境保护措施落实情况调查

项目在建设过程中执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，环保审查、审批手续完备。项目环境影响评级报告中提出了较为全面的环境保护措施，环评和批复中提到的各项环保要求在工程建设中已基本得到落实。

### 3、生态环境影响调查结论

经调查，项目完工后对管线等临时占地进行了清理并采取了植被恢复措施，临时占地植被恢复治理率 100%。项目施工期间，各项水保措施和生态保护措施基本落实，未产生重大生态问题。目前正处于生态系统逐步恢复过程。

### 4、污染影响调查结论

#### （1）水环境影响调查

经调查，项目在建设过程中产生的废水主要为生产废水和生活污水。本工程施工过程中管道试压采用空气试压，无生产废水；项目不设施工营地，无生活污水。

#### （2）环境空气影响调查

本项目施工期大气环境影响主要包括管沟开挖堆土、运输车辆、施工机械行驶引起的扬尘，柴油机械及运输车辆排放的尾气，管道施工焊接时产生的焊接烟尘，项目各单项工程施工期较短，排放量较少，未对区域环境空气质量造成明显影响，随着施工结束，大气环境已经恢复到施工前水平。通过调查及询问，项目施工期废气对当地环境影响较小，未造成大气污染，也无扰民纠纷和投诉现象发生。

#### （3）声环境影响调查

本项目施工期噪声来源于施工开挖等施工活动中的施工机械运行、汽车运输等。

经现场调查，本项目各管线 200m 范围内无居民住宅。施工期间未发生噪声污染事件，也无扰民纠纷和投诉现象发生。

#### （4）固废影响调查

本项目产生的生活垃圾收集后拉运至项目部统一处理；施工废料外售综合利用；管线施工产生的弃土用于附近低洼处填补，不外排。经调查可知，本项目施工期固废均已得到妥善处置，现场未遗留固体废物，也无扰民纠纷和投诉现场。

#### 5、环境风险事故应急预案及防范措施

本项目由中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司运营管理，建设单位建立了详细周密的应急救援体系，设立了各级应急救援网络，并制定了风险防范措施和应急预案。根据调查，工程自试运营以来未发生过破坏性风险事故，风险防范措施有效。

#### 6、环境管理情况

建设单位制定了完善的环境管理制度，对全厂的各项环保工作作出了详细、具体的规定；设立了环保管理机构，专人专业管理环保工作。

#### 7、验收调查结论


通过调查分析，本项目在建设及试运行过程中，严格执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度；各项污染物治理措施有效，能够达标排放，未对周围环境产生明显影响；相关的生态保护和恢复措施按照要求进行了落实；建立健全了各项安全防护措施。符合建设项目竣工环境保护验收条件。

#### 8、建议

（1）加强对植被恢复情况调查，对植被成活率较低的区域进行补种，确保植被成活。加快对剩余临时占地的植被恢复进度。

（2）建议加强巡查、检查，发现隐患应及时处理，避免管线泄漏污染事故的发生对周围环境造成不利影响。

附图

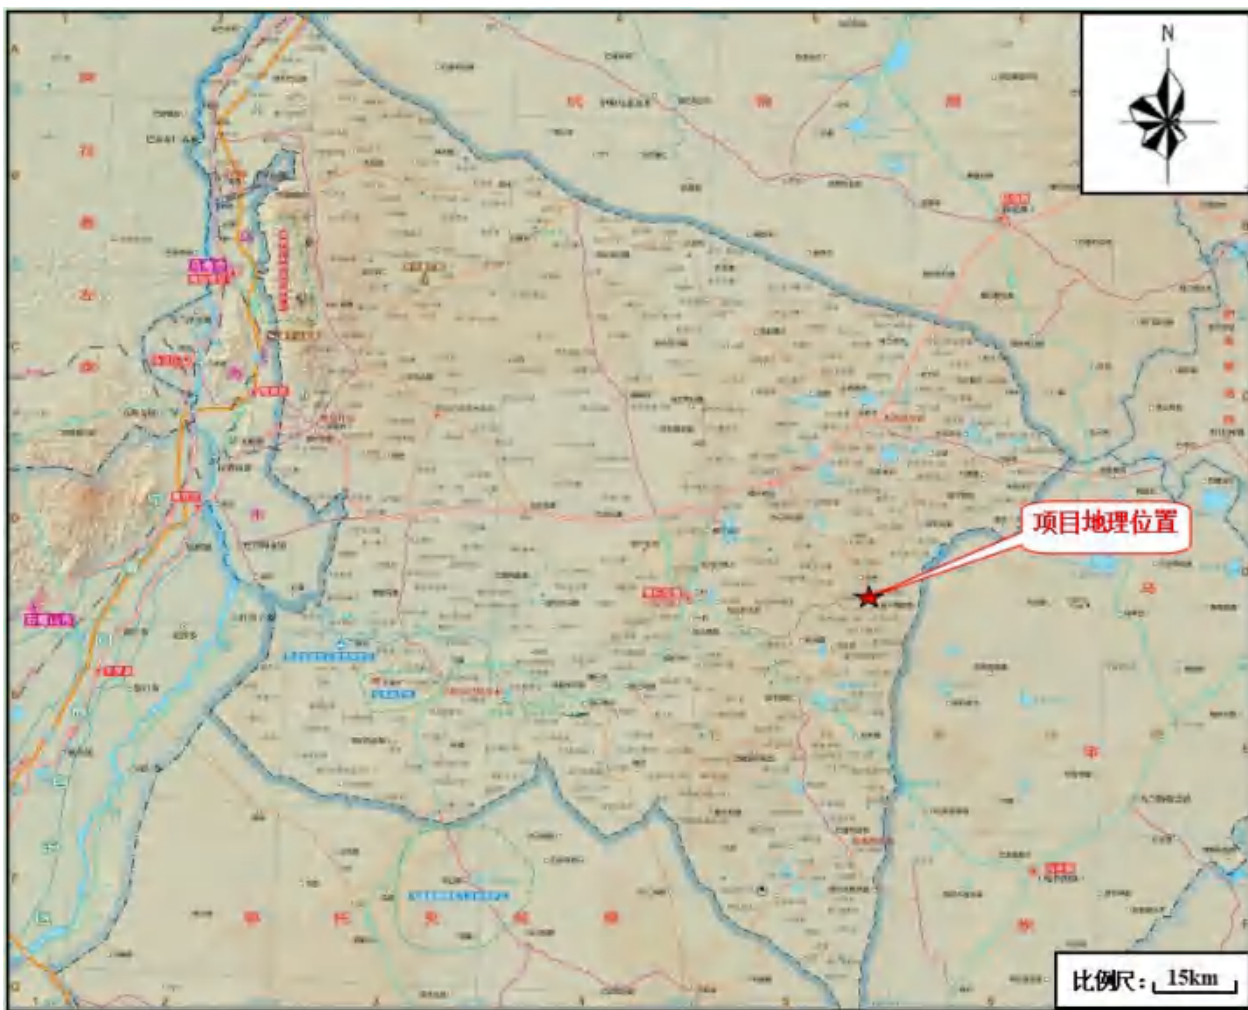

附图1 地理位置图



附图2 管线走向图

## 附件

附件1:《中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目(查汗陶勒盖嘎查)竣工环境保护“三同时”验收登记表》;

附件2:《鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局关于中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目(查汗陶勒盖嘎查)环境影响报告表的批复》(鄂环鄂评字【2020】177号);

附件3:《中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司苏10区块 $10\times 10^8\text{m}^3/\text{a}$ 产能开发建设项目突发环境事件应急预案》(150624-2022-061-L);

附件4: 验收调查单位营业执照;

附件5:《中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目(查汗陶勒盖嘎查)竣工环境保护自主验收意见》及签到表;

附件6:《中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目(查汗陶勒盖嘎查)竣工环境保护验收调查报告表》公示截图。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司

填表人（签字）：李洋

项目经办人（签字）：李洋

建 设 项 目	项目名称	中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目 (查汗陶勒盖嘎查)				项目代码	—			建设地点	鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇查汗陶勒盖嘎查			
	行业类别(分类管理名录)	B0721陆地天然气开采				建设性质	■新建 □改扩建 □技术改造			项目中心坐标	—			
	设计生产能力	新建采气管线1条, 管线总长243m				实际生产能力	新建采气管线1条, 管线总长 243m			环评单位	内蒙古意丰环保科技有限公司			
	环评文件审批机关	鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局				审批文号	鄂环鄂评字【2020】177号			环评文件类型	建设项目环境影响报告表			
	开工日期	2021年3月				竣工日期	2022年6月			排污许可证申领时间	—			
	环保设施设计单位	—				环保设施施工单位	—			本工程排污许可证编号	—			
	验收单位	内蒙古鸣霄技术咨询有限责任公司				环保设施监测单位	—			验收检测时工况(%)	—			
	投资总概算(万元)	12				环保投资总概算(万元)	1.2			所占比例(%)	10			
	实际总投资(万元)	12				实际环保投资(万元)	2			所占比例(%)	16.67			
	废水治理(万元)	0	废气治理(万元)	0.1	噪声治理(万元)	0.2	固体废物治理(万元)	0.3			绿化及生态(万元)	1	其他(万元)	0.4
新增废水处理设施能力					新增废气处理设施能力				年平均工作时	8760h/a				
运营单位	中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司				运营单位社会统一信用代码(或组织机构代码)	91150626328968760Q			验收时间	2022.12				
污 染 物 排 放 达 标 与 总 量 控 制  (工业 建设项 目详 填)	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水	0.0000	—	—	0.0000	0.0000	0.0000			0.0000			0.0000	
	化学需氧量	0.0000	0.0000				0.0000			0.0000			0.0000	
	氨氮	0.0000	0.0000				0.0000			0.0000			0.0000	
	石油类	0.0000	0.0000				0.0000			0.0000			0.0000	
	废气		—	—			0.0000	—	—	0.0000	—	—	0.0000	
	二氧化硫				0.0000	0.0000	0.0000			0.0000			0.0000	
	烟尘				0.0000	0.0000	0.0000			0.0000			0.0000	
	工业粉尘						0.0000			0.0000			0.0000	
	氮氧化物				0.0000	0.0000	0.0000			0.0000			0.0000	
	工业固体废物						0.0000			0.0000			0.0000	
	与项目有关的其他特征污染	生活垃圾					0.0000	0.0000			0.0000			0.0000
	废机油(t/a)					0.0000	0.0000			0.0000			0.0000	
						0.0000				0.0000			0.0000	

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)=(4)-(5)-(8)-(11)+(1) 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

附件二：



## 鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局文件

鄂环鄂评字[2020]177号

### 鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局关于 中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气 田分公司天然气管线项目（查汗陶勒盖嘎查） 环境影响报告表的批复

中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司：

你单位报送的由内蒙古意丰环保科技有限公司编制的《中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司天然气管线项目（查汗陶勒盖嘎查）环境影响报告表》（以下简称报告表）收悉。经审核，现批复如下：

一、本项目位于鄂托克旗乌兰镇查汗陶勒盖嘎查，新建输气管线1条，共243m。管线均选用D114×5直缝钢管，管线作业宽度为8.0m。项目总投资12万元，其中环保投资1.2万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护 and 环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的



扫描全能王 创建

缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、建设单位在认真落实报告表中提出的污染防治和生态措施的同时，要做好以下工作：

1、加强施工期环境管理，土石方开挖及管道安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。管线施工过程须做到“分层开挖、分层堆放和分层回填”，施工结束后及时进行植被恢复并与周围生态景观协调一致。建设单位应制定详细的生态植被恢复措施与计划，并安排足够的生态恢复专用资金，保证施工结束后能立即进行生态恢复。

2、各种施工活动应严格控制在施工区域内，须配备洒水车、篷布等防尘设备，定期洒水，有效控制施工期的扬尘污染。物料堆场等的选址应远离居民区等环境敏感目标。居民点附近施工须设置围挡，降低扬尘对居民的影响。选用低噪声施工机械，采取有效措施控制施工期噪声污染。在环境敏感点附近，禁止夜间施工，防止噪声扰民。确有需要实行夜间作业的，须提前经有关部门批准，并对外公示。施工期间的管沟挖方用于埋管后的覆土回填，少量弃土用于附近低洼处填补；生活垃圾采用垃圾袋集中收集运送至就近的垃圾填埋场统一处理；产生的施工废料收集后外售综合利用。

3、管线穿越道路须增加管线壁厚度，做好防腐、防渗措施，制定合理的穿越方案，并在征得有关主管部门的同意后方可实施。

4、管线设计须符合《输气管道工程设计规范》和《原油和天然气工程设计防火规范》要求，确保不会对周围敏感目标产生不利影响。按照相关法律、法规和技术规范要求，禁止在井场、管线附近建设居民点、医院等敏感建筑物。

三、项目建设必须严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，落实各项生态保护和污染防治措施。项目竣工后，按规定程序进行环境保护竣工验收，验收合格后方可正式投入使用。

四、由鄂托克旗生态环境综合行政执法大队负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评



扫描全能王 创建

文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局  
2020年12月25日



---

鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局      2020年12月25日印发






扫描全能王 创建

附件三:

### 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

单位名称	中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司	机构代码	91150626328968760Q
法定代表人	于开斌	联系电话	0477-7228238
联系人	江涛	联系电话	0477-7225552
传真	0477-7225552	电子邮箱	jt.gwdc@cnpc.com.cn
地址	鄂尔多斯市鄂托克旗		
预案名称	中国石油集团长城钻探工程有限公司苏里格气田分公司苏10区块10×10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup> /a产能开发建设项目突发环境事件应急预案		
风险级别	L(一般)		
<p>本单位于2022年10月31日签署发布了突发环境事件应急预案, 备案条件具备, 备案文件齐全, 现报送备案。</p> <p>本单位承诺, 本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实, 无虚假, 且未隐瞒事实。</p> <p style="text-align: right;">预案制定单位(公章)</p> 			
预案签署人	于开斌	报送时间	2022.11.9

突发环境事件应急预案备案文件目录	1. 突发环境事件应急预案备案表； 2. 环境应急预案及编制说明（纸质文件和电子文件）： 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明包括（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3. 环境风险评估报告（纸质文件和电子文件）； 4. 环境应急资源调查报告（纸质文件和电子文件）； 5. 环境应急预案评审意见（纸质文件和电子文件）。		
备案意见	该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于2022年11月9日收讫，文件齐全，予以备案。  <div style="text-align: right;">  <p>备案受理部门（公章） 2022年11月9日</p> </div>		
备案编号	150624-2022-061-L		
报送单位	长城钻探苏里格气田分公司		
受理部门负责人		经办人	

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般 L、较大 M、重大 H）及跨区域（T）表征字母组成。例如，河北省永年县\*\*重大环境风险非跨区域企业环境应急预案 2015 年备案，是永年县环境保护局当年受理的第 26 个备案，则编号为：130429-2015-026-H；如果是跨区域的企业，则编号为：130429-2015-026-HT。





